


# Udskiftning af altankviste - Overordnet tidsplan

Udført af: PL  
 Dato: 16.12.2015  
 Senest opdateret:

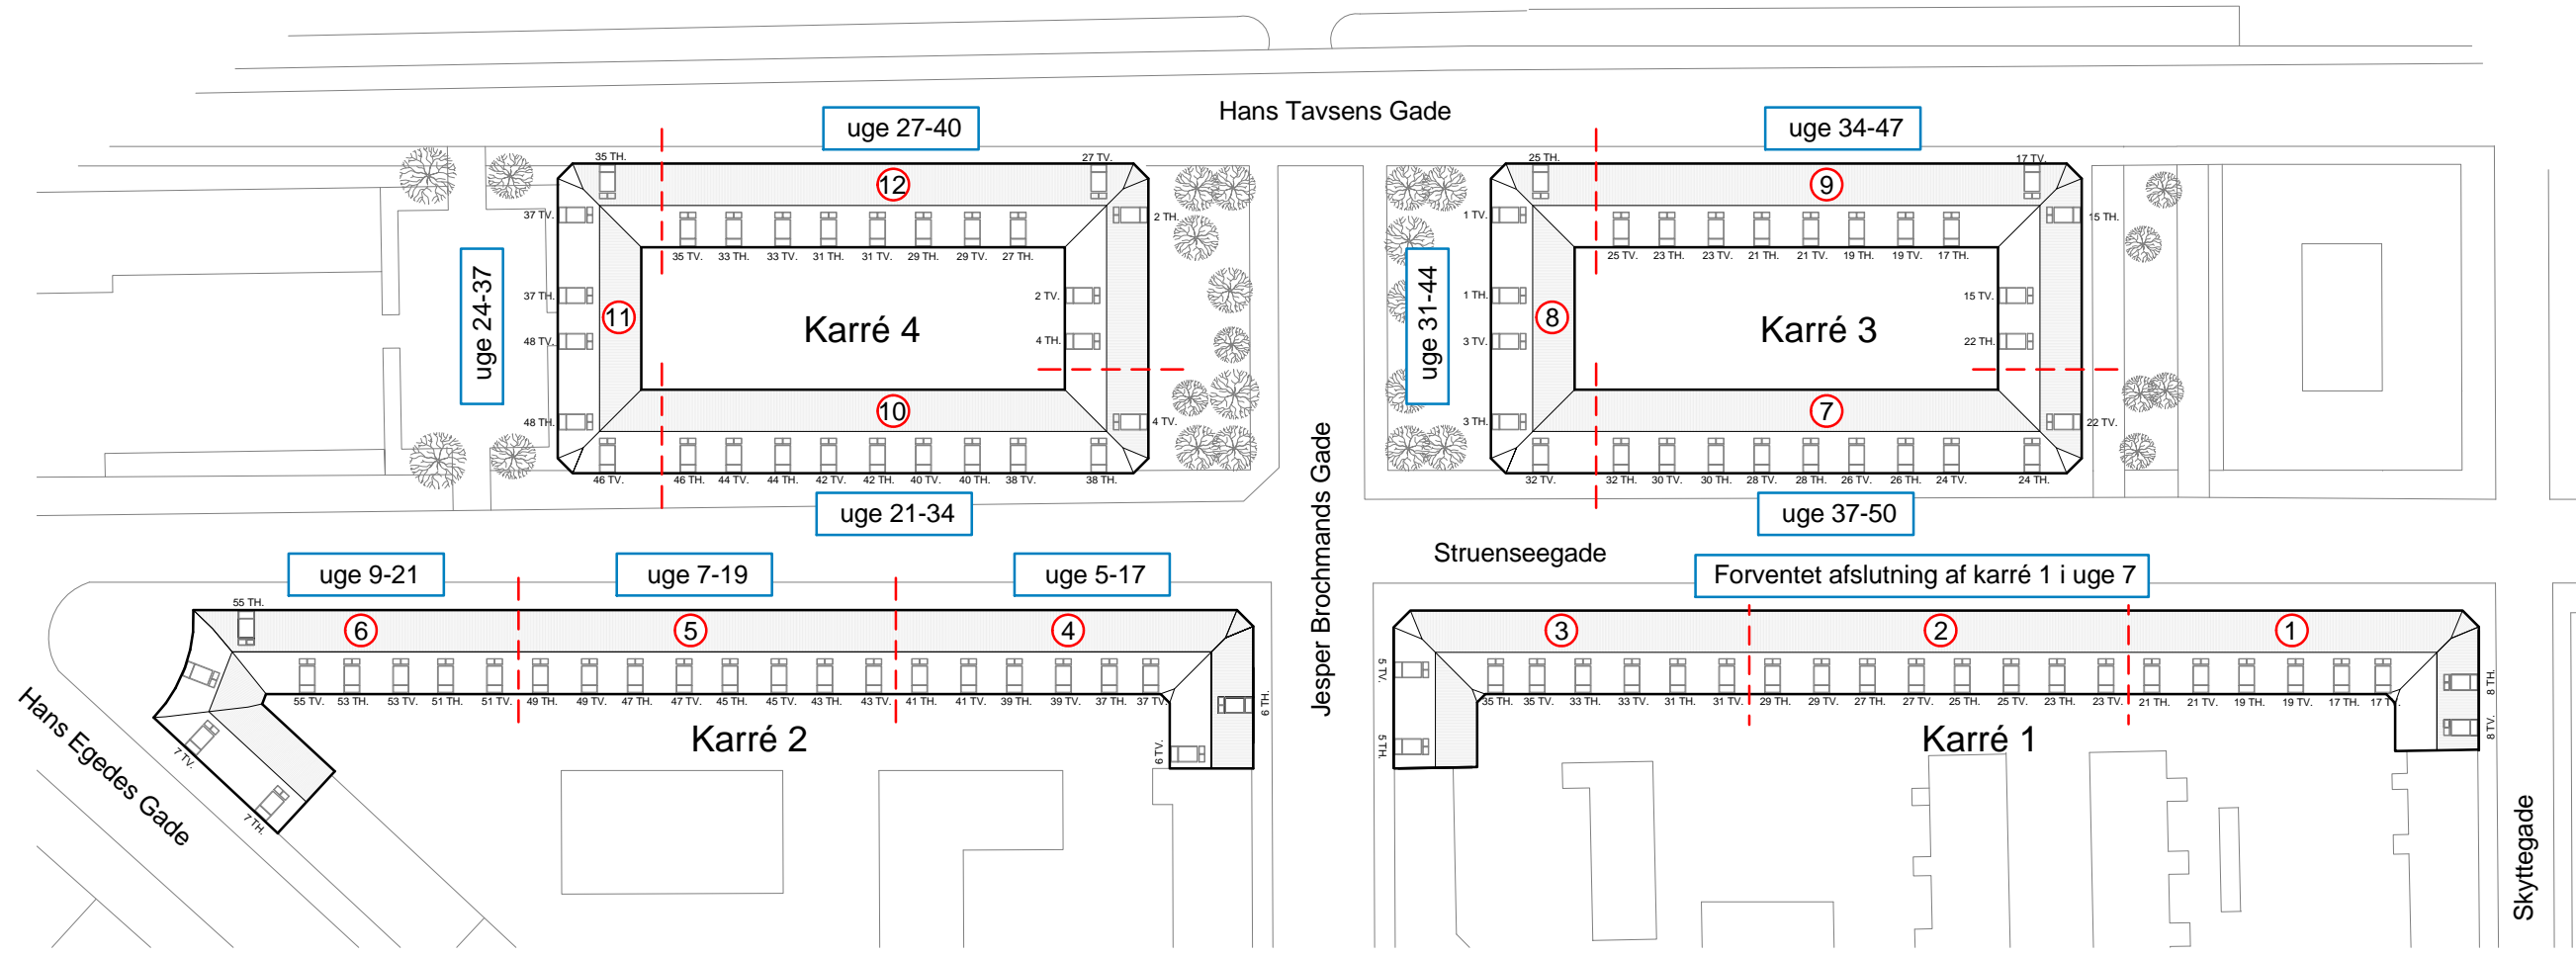

## Signaturforklaring:

--- Etapedeling

① **Etape**  
 (Er ikke udtryk for rækkefølge, men kun lokalisering).

uge 37-50 **Anslået byggeperiode**  
 Angivet byggeperiode er inden for 2016.  
 Byggeperioden indeholder:  
 - Demontering af tegl og kviste  
 - Opretning af tagflade  
 - Opbygning af kvistbund  
 - Montering af nye kviste  
 - Indvendige arbejder  
 Byggeperioden indeholder ikke opstilling og nedtagning af stillads.

## Note:

Tidsplanen omhandler udførelse af det oprindelige projekt med udskiftning af altankvistene, samt udbedringer af undertag og konstruktioner på tagflader med altankviste.

Tidsplanen er stærkt afhængig af de eksisterende forhold og den er udført på basis af erfaringer fra etape 1-3. Tidsplanen vil derfor ændre sig hvis forholdene viser sig anderledes i etape 4-12.

Ændringer af etapedelinger og rækkefølgen på etaperne kan forekomme, hvis det under byggeprocessen viser sig gunstigt for det samlede projektforløb.
